



INDICADOR DE OBRAS PDET FINANCIADO A TRAVÉS DE PROYECTOS MARCADOS CON EL TRAZADOR CONSTRUCCIÓN DE PAZ ASOCIADO A PDET

INFORME DE AVANCE SEPTIEMBRE 2020

Indicador de obras de infraestructura marcados con el trazadora construcción de paz

El indicador de obras PDET se construyó con el fin de hacer seguimiento a la ejecución de las obras que realizan entidades del orden nacional en municipios PDET, estas obras se ejecutan a través de proyectos que hacen parte del trazador Construcción de Paz asociado a PDET.

El avance de las obras se mide a través del seguimiento a dos indicadores: el primero, obras de infraestructura terminadas incluye muelles, mejoramiento y ampliación de sedes educativas, ampliación de cobertura eléctrica, escenarios deportivos, acueductos y alcantarillados y Bibliotecas.

El segundo indicador, mide los kilómetros de vías terciarias transitables en municipios PDET y financiadas con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación PGN. A continuación, se exponen las metas, avances cuantitativo y cualitativo del indicador y principales alertas.





1. Obras de Infraestructura terminadas en municipios PDET y financiadas con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación PGN

Conforme al ajuste de las metas, se proyectan **526 obras** de a terminar al 2022 relacionadas con infraestructura fluvial, infraestructura de energía eléctrica, infraestructura en agua potable y saneamiento básico, infraestructura educativa, infraestructura productiva, infraestructura cultural e infraestructura deportiva de 7 sectores nacionales.

Las metas proyectadas para las tres vigencias son:

Meta 2020	243	Meta 2021	198	Meta 2022	86
------------------	------------	------------------	------------	------------------	-----------


Entidad	Tipo de Obras	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta Acumulada
INVIAS	Muelle Obra	4	4	3	11
Ministerio de Educación	Mejoramiento, ampliación y/o reposición Instituciones Educativas	205	168	50	423
Ministerio de Minas y Energía / IPSE	Ampliación de cobertura Energética ZNI e interconectado Mejoramiento de la infraestructura eléctrica	18	17	31	66
Ministerio del Deporte	Escenarios deportivos y recreativos	9	3	2	14
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Acueductos y Alcantarillado	6	2	0	8
Ministerio de Cultura	Bibliotecas construidas	0	4	0	4
Prosperidad Social	Plaza de Mercado construida	1	0	0	1
TOTAL		243	198	86	526



1.1. Avance cuantitativo del indicador (metas 2020)

Con corte al 30 de septiembre de 2020, el indicador presenta un avance de 67%, las entidades que van más adelantadas en el cumplimiento de las metas propuestas son el Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Minas y Energía/IPSE y el INVIAS.

Gráfica 1. Avance indicador de obras PDET metas 2020 Información con corte a 30 de septiembre

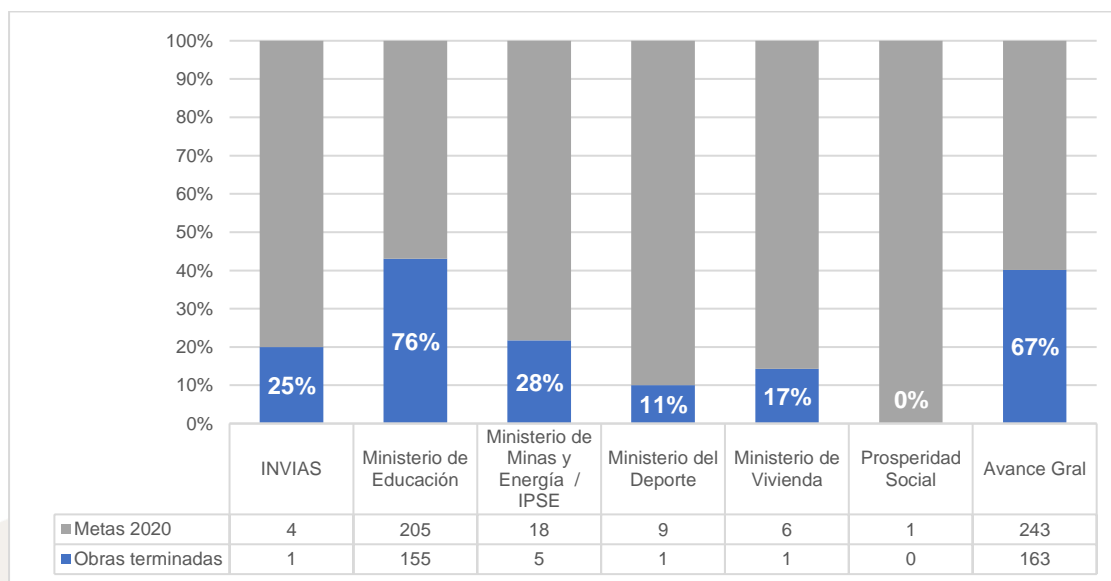

1.2. Avances cualitativos

En este informe se encuentra información de Ministerio del Deporte, IPSE, Ministerio de Minas y Energía, Prosperidad Social e INVIAS.

El Ministerio de Educación Nacional y El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio no enviaron reporte de avance.

Ministerio del Deporte

Esta entidad reportó 9 obras correspondientes a escenarios deportivos y recreativos que se están construyendo en 8 municipios PDET: San Pedro de Urabá, San Juan Nepomuceno, Florencia, Condoto, Riosucio, Puerto Libertador, San José del Guaviare y Aracataca. Es importante señalar que en el municipio de Florencia (Caquetá) se están adelantando 2 intervenciones por parte de esta entidad.





De acuerdo con la información recibida de las 9 intervenciones reportadas, se terminó una obra en el municipio de Florencia. De igual forma, se reportó una obra en ejecución en el municipio de Puerto Libertador; Por otra parte, el Ministerio informó que 6 obras se encuentran suspendidas en los municipios siguientes municipios: San Pedro de Urabá, San Juan Nepomuceno, Florencia, Riosucio, San José del Guaviare y Aracataca. Finalmente, el Ministerio reporta que en el municipio de Condoto no se han iniciado las actividades para la construcción de las obras. (Ver cuadro siguiente)

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas - IPSE

La entidad reportó 5 obras, de las cuales 3 pertenecen a la vigencia fiscal 2020, una a la vigencia fiscal 2021 y otra a la vigencia 2022.

Las tres obras PDET reportadas para la vigencia fiscal 2020 se encuentran localizadas en los municipios de Acandí (Chocó), Unguía (Chocó) y San Vicente del Caguán (Caquetá). La obra reportada en el municipio de Acandí se encuentra terminada, mientras que la obra localizada en Unguía está en ejecución y la de San Vicente del Caguán no ha sido iniciada.

De acuerdo con el reporte cualitativo de la entidad las obras localizadas en el municipio de Acandí están pendientes de entregarse, en Unguía se reiniciarán las obras el 12 de octubre y en el municipio de San Vicente del Caguán se espera iniciar labores a mediados de noviembre una vez que se reciba el proyecto estructurado de mejoramiento de infraestructura de la PCH Guacamayas.

Ministerio de Minas y Energía

La entidad reporta 61 obras en municipios PDET, de acuerdo con la información provista por la entidad todas se encuentran regionalizadas. De las 15 obras correspondiente a la vigencia 2020, 4 están terminadas, 11 se encuentran en ejecución. Los municipios sujetos de intervención son los siguientes: Condoto, San Vicente del Caguán, Ciénaga y Tierralta con obras terminadas. Por otra parte, se encuentran San Andrés de Tumaco (4 intervenciones), Puerto Rico, San José del Guaviare, Cumbitara, San Juan del Cesar, Fonseca, Solano y Carmen de Bolívar, cuyas obras se encuentran en ejecución.

La entidad no reporta avances cualitativos en ninguna de sus intervenciones, ni alertas a tener en cuenta.





Prosperidad Social

La entidad reportó una intervención en el municipio de Fundación correspondiente a la adecuación del mercado público del municipio. En cuanto al estado de la obra, esta reporta suspendida por aislamiento de trabajadores en cumplimiento de protocolos de bioseguridad, de acuerdo con lo informado por la entidad se programó el reinicio de la obra para el 8 de octubre de 2020.

En el reporte de avance cualitativo se informan actividades de columnas, mampostería, piso de concreto en la zona de parqueo, instalación cubierta, Zona de descargue, actividades eléctricas y carpintería metálica ejecutada.

Ministerio de Cultura

Esta entidad reportó 4 intervenciones en los municipios de El Tambo, Morelia, San Pablo y Toluviejo. Estas intervenciones están programadas para ser ejecutadas en la vigencia 2021. Por lo cual, no hay reporte de avance.

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Esta entidad reporta 4 obras: 1 de construcción, mantenimiento y mejoramiento de muelles en el municipio de Carmen del Darién, 1 obra de protección en Santa Barbara de Iscuandé, 2 obras de dragado de mantenimiento en los municipios de Francisco Pizarro y Puerto Asís.

En lo relacionado con el avance de las obras se reporta terminado y entregado el muelle en Carmen del Darién, en Santa Barbara de Iscuandé la obra se encuentra en ejecución, aunque la obra estuvo suspendida entre el 18 de marzo y el 2 de agosto por la emergencia sanitaria, en el municipio Francisco Pizarro se suscribió un convenio interadministrativo entre INVIAS y el municipio, en desarrollo del mismo el ente territorial se encuentra adelantando los procesos de contratación de la ejecución de la obra, mientras que el INVIAS está adelantando la contratación de la interventoría, finalmente, en Puerto Asís se informa que la obra está en proceso de contratación, más exactamente en la etapa de evaluación de propuestas.

Ministerio de Educación Nacional

La entidad reporta un total de 367 obras, pertenecientes a las vigencias 2020 y 2021. De las 367 obras reportadas, 144 no están localizadas en municipios PDET, las 223 obras PDET restantes 204 pertenecen a la vigencia 2020 y 19 a la vigencia 2021.





De 205 obras que corresponden a la meta para 2020, la entidad reporta 155 obras terminadas, 42 se encuentran en ejecución y 7 obras de la vigencia 2020 se encuentran sin iniciar. De las obras pertenecientes a la vigencia 2021, 7 están en ejecución y 12 se encuentran sin iniciar labores.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

La entidad reportó 8 obras a realizarse en las vigencias 2020 y 2021, 7 de estas corresponden a la vigencia 2020 y 1 para la vigencia 2021. Las obras se localizan en los siguientes municipios: Caloto (acueducto y alcantarillado), Toribío (acueducto), San Juan Del Cesar (alcantarillado), Aracataca (alcantarillado), Vista Hermosa (acueducto y alcantarillado), Tibú (acueducto), Los Andes (alcantarillado) y Valencia (acueducto).

En cuanto al avance de las metas la entidad reportó 1 obra terminada en el municipio de Vista Hermosa (Meta), otras 3 se encuentran en ejecución, 1 está surtiendo los trámites para la contratación y 3 están suspendidas.

1.3. Principales alertas

Ministerio del Deporte

Aunque esta entidad reportó que 6 de las 9 intervenciones que tiene como meta en 2020 se encuentran suspendidas. La entidad no reporta alertas, ni se encontró información explicativa en el avance cualitativo.

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas - IPSE

La entidad reporta las siguientes alertas:

- Con respecto al proyecto “Proyecto de mejoramiento de la infraestructura eléctrica, suministro, instalación y puesta en servicio de grupos electrógenos en la central de generación de Acandí, Capurganá, en el departamento del Chocó.” Se reporta que se encuentra pendiente de realizar desplazamiento al sitio para entrega y recibo de las plantas eléctricas.
- En relación con las 2 obras reportadas para las vigencias 2021 y 2022 la entidad informa que “Corresponde a la regionalización inicial de Proyecto de Inversión BPIN 2018011000873. Regionalización que puede variar de acuerdo con la priorización que se realice para dar respuesta a las necesidades de las comunidades en las Zonas No Interconectadas”



Prosperidad Social

En este sentido se reporta lo siguiente:

Contratista solicitó la suspensión del proyecto, debido a aplicación de protocolos de bioseguridad por posible foco de infección de COVID 19 en algunos participantes del convenio.

Ministerio de Educación Nacional

La entidad tiene 7 obras sin iniciar, al respecto la entidad informa que los proyectos cuentan con la viabilidad técnica y jurídica, que se encuentran próximos a iniciar ejecución, sin embargo, no menciona fecha de inicio de las actividades.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

La entidad reportó 3 obras suspendidas (Toribío, Tibú y Los Andes) pero no aportó información que cualitativa que permita conocer el motivo de la suspensión y la fecha de reinicio de las obras.

2. Kilómetros de vías terciarias transitables en municipios PDET y financiadas con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación PGN

De acuerdo con la proyección del Instituto Nacional de Vías INVIAS, al 2022 se proyecta la terminación de **1320 kilómetros de vías terciarias transitables** en municipios PDET; entre las intervenciones se estima el mejoramiento de los corredores viales representado en obras de drenaje, pavimentos y muros de contención, así como el mantenimiento periódico y el rutinario realizado con maquinaria y mano de obra.

Las metas proyectadas para las tres vigencias son:

Meta 2020	120	Meta 2021	600	Meta 2022	600
-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----

Este indicador no ha reportado avance con corte a la realización del presente informe, por cuanto aún se encontraba en etapa de aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación.

